

令和4年2月10日
北海道電力株式会社

泊3号炉の審査工程について

泊3号炉のプラント側審査工程は、昨年8月26日の審査会合に説明していますが、基準津波および基準地震動の説明に時間を要していることから遅延しています。

また、基準津波策定後も、昨年8月26日に想定していたより入力津波等の解析工程が長くなる状況であり、現在、工程短縮の検討を進めているところです。

一方で、解析結果が出る前においても防潮堤については設計の考え方を説明させていただいており、解析終了後の手戻りが無いように努めています。防潮堤以外の事項についても同様に解析終了前に説明すべき事項を説明し全体工程の短縮に努めていきます。

また、耐震・耐津波設計以外の事項については、概ね審査済みとされているものの、バックフィット案件等新たに説明する事項があるためこれらについて説明していきます。


以上

泊3号炉 説明スケジュール

泊3号炉の説明スケジュールは、下記の通り。

説明スケジュール(案)

凡例：説明期間 解析期間

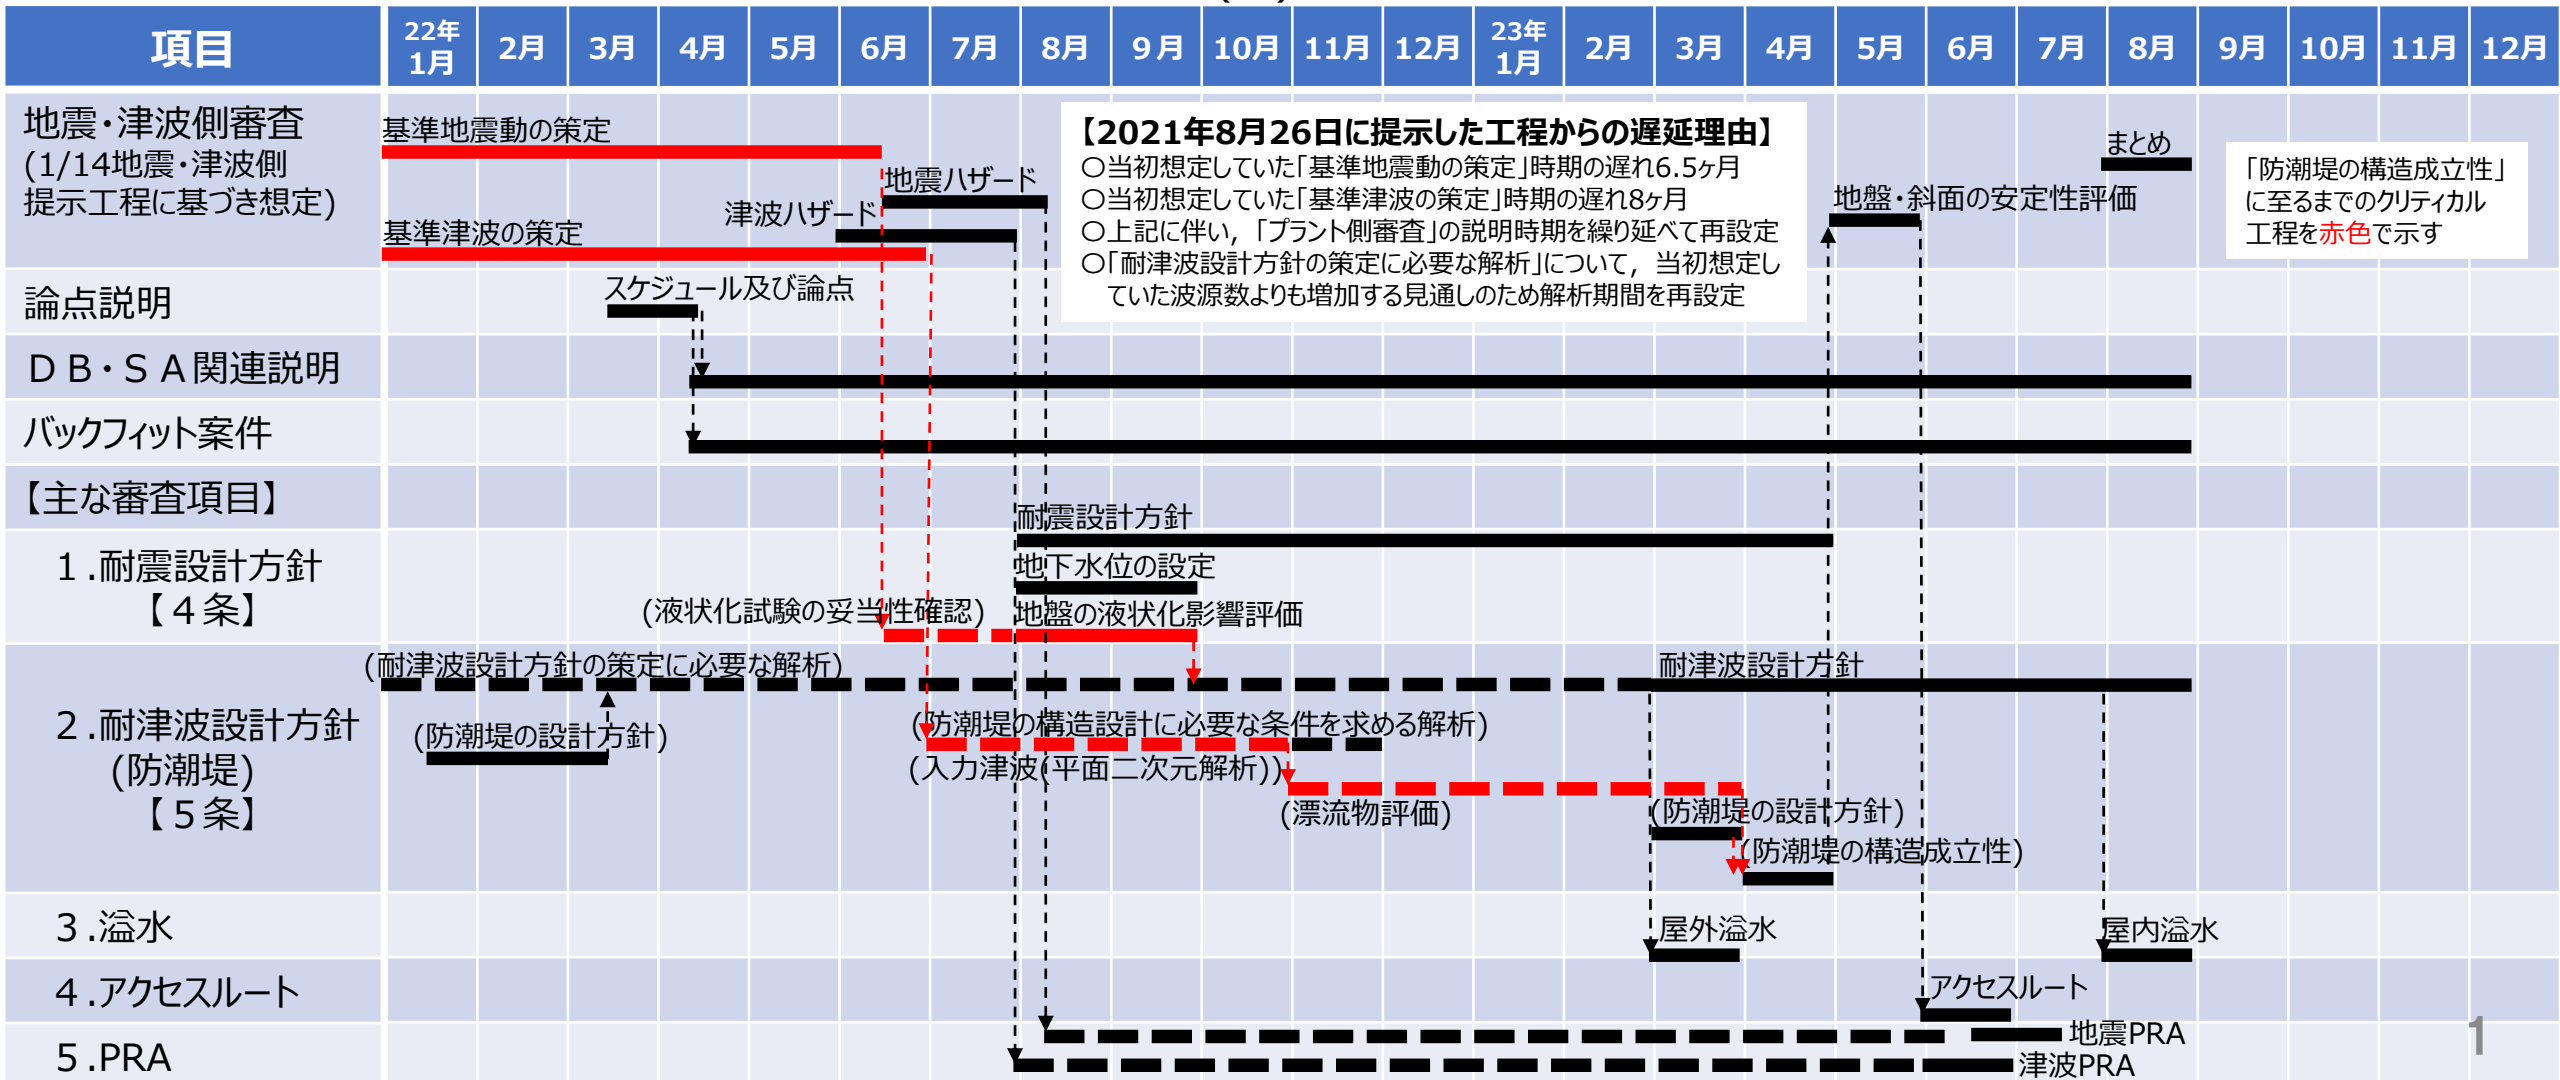

「防潮堤の構造成立性」に至るまでのクリティカル工程を赤色で示す

まとめ
