


火災感知設備増設工事 設工認全体スケジュール

現状

- 工認
 - ・代表プラント(O34)は、8月23日補正申請済
 - ・後続プラント(M3、T1~4)を2022年4月28日に申請済
現在、審査中。
- 工事
 - ・全プラント先行着手で工事实施中

目標期限の設定根拠

- バックフィット期限を考慮すると、**2023年内までに工事部材の手配が必要**
- 現在、工事は先行着手しているが、審査を通じ追加工事が発生した場合、半導体不足等の影響により、部材手配期間(約6ヶ月)、その後の工事及び使用前検査考慮すると、**2023年6月を目途に特重を含めた全ての設工認の認可が必要**
- 特重の審査期間を、半年程度確保することを考慮すると、**後続プラント(M3、T1~4)は2022年11月頃の認可が必要**

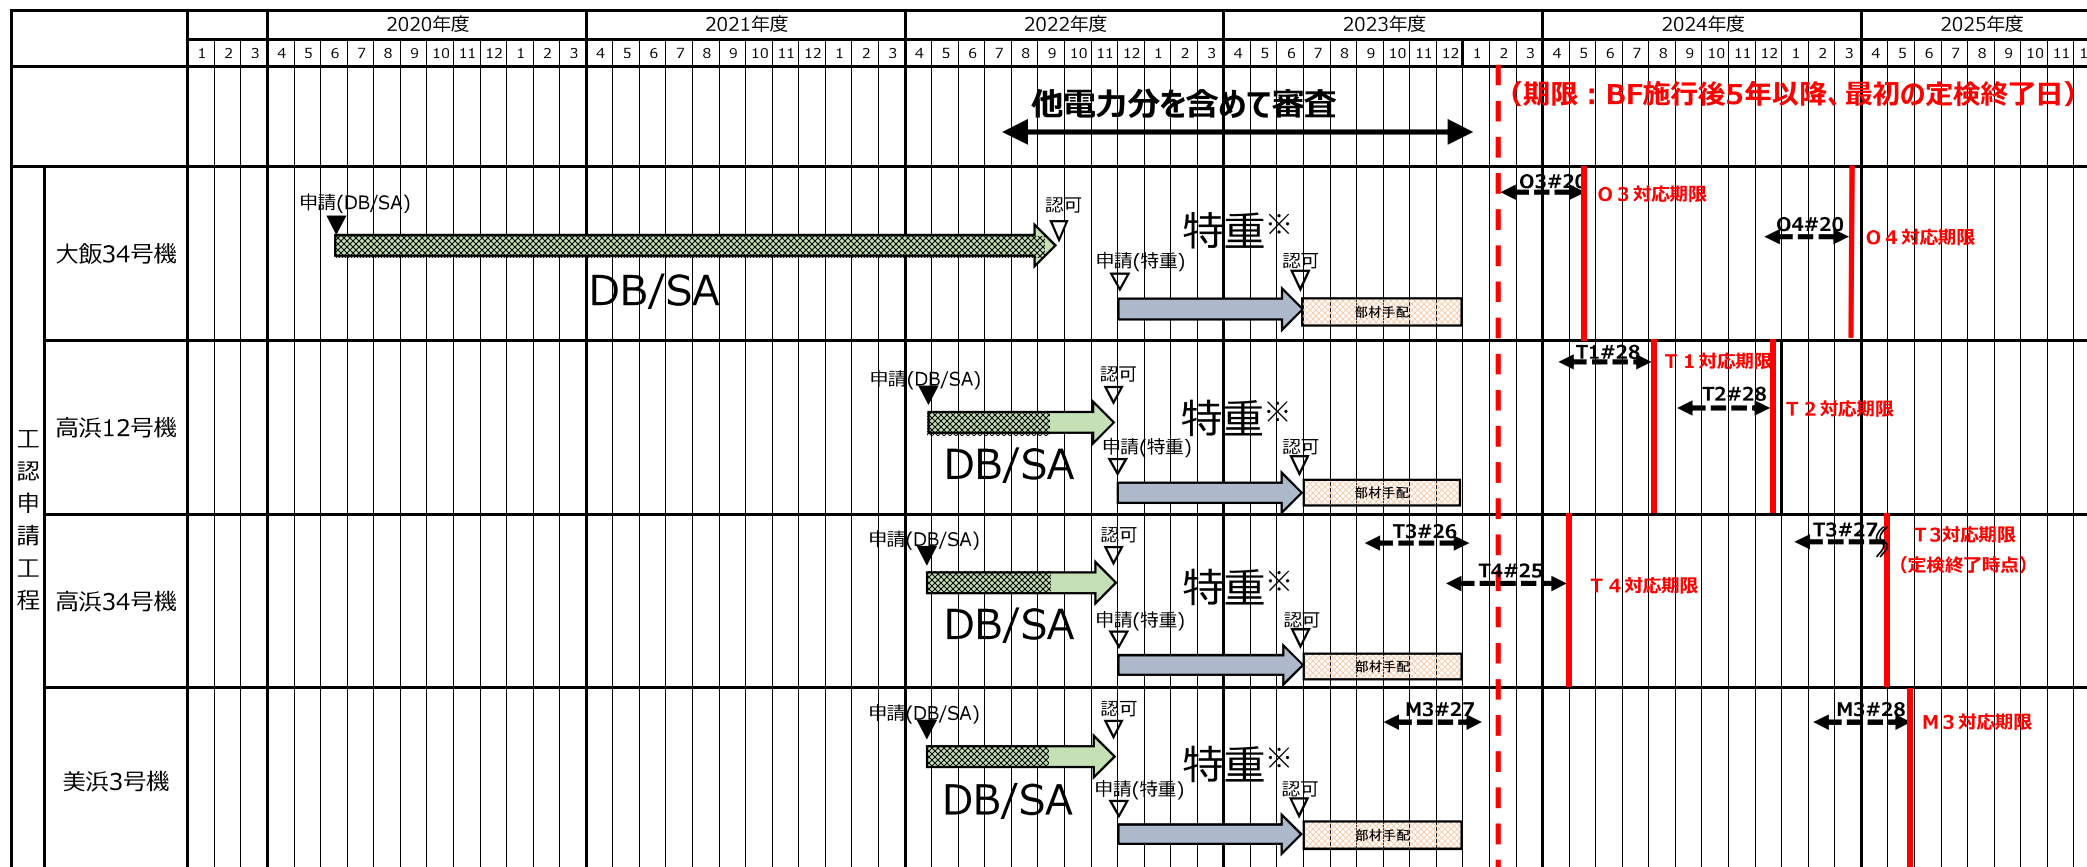

※特重には、第三バッテリーの変更認可申請を含む
