



# 今後の進め方について

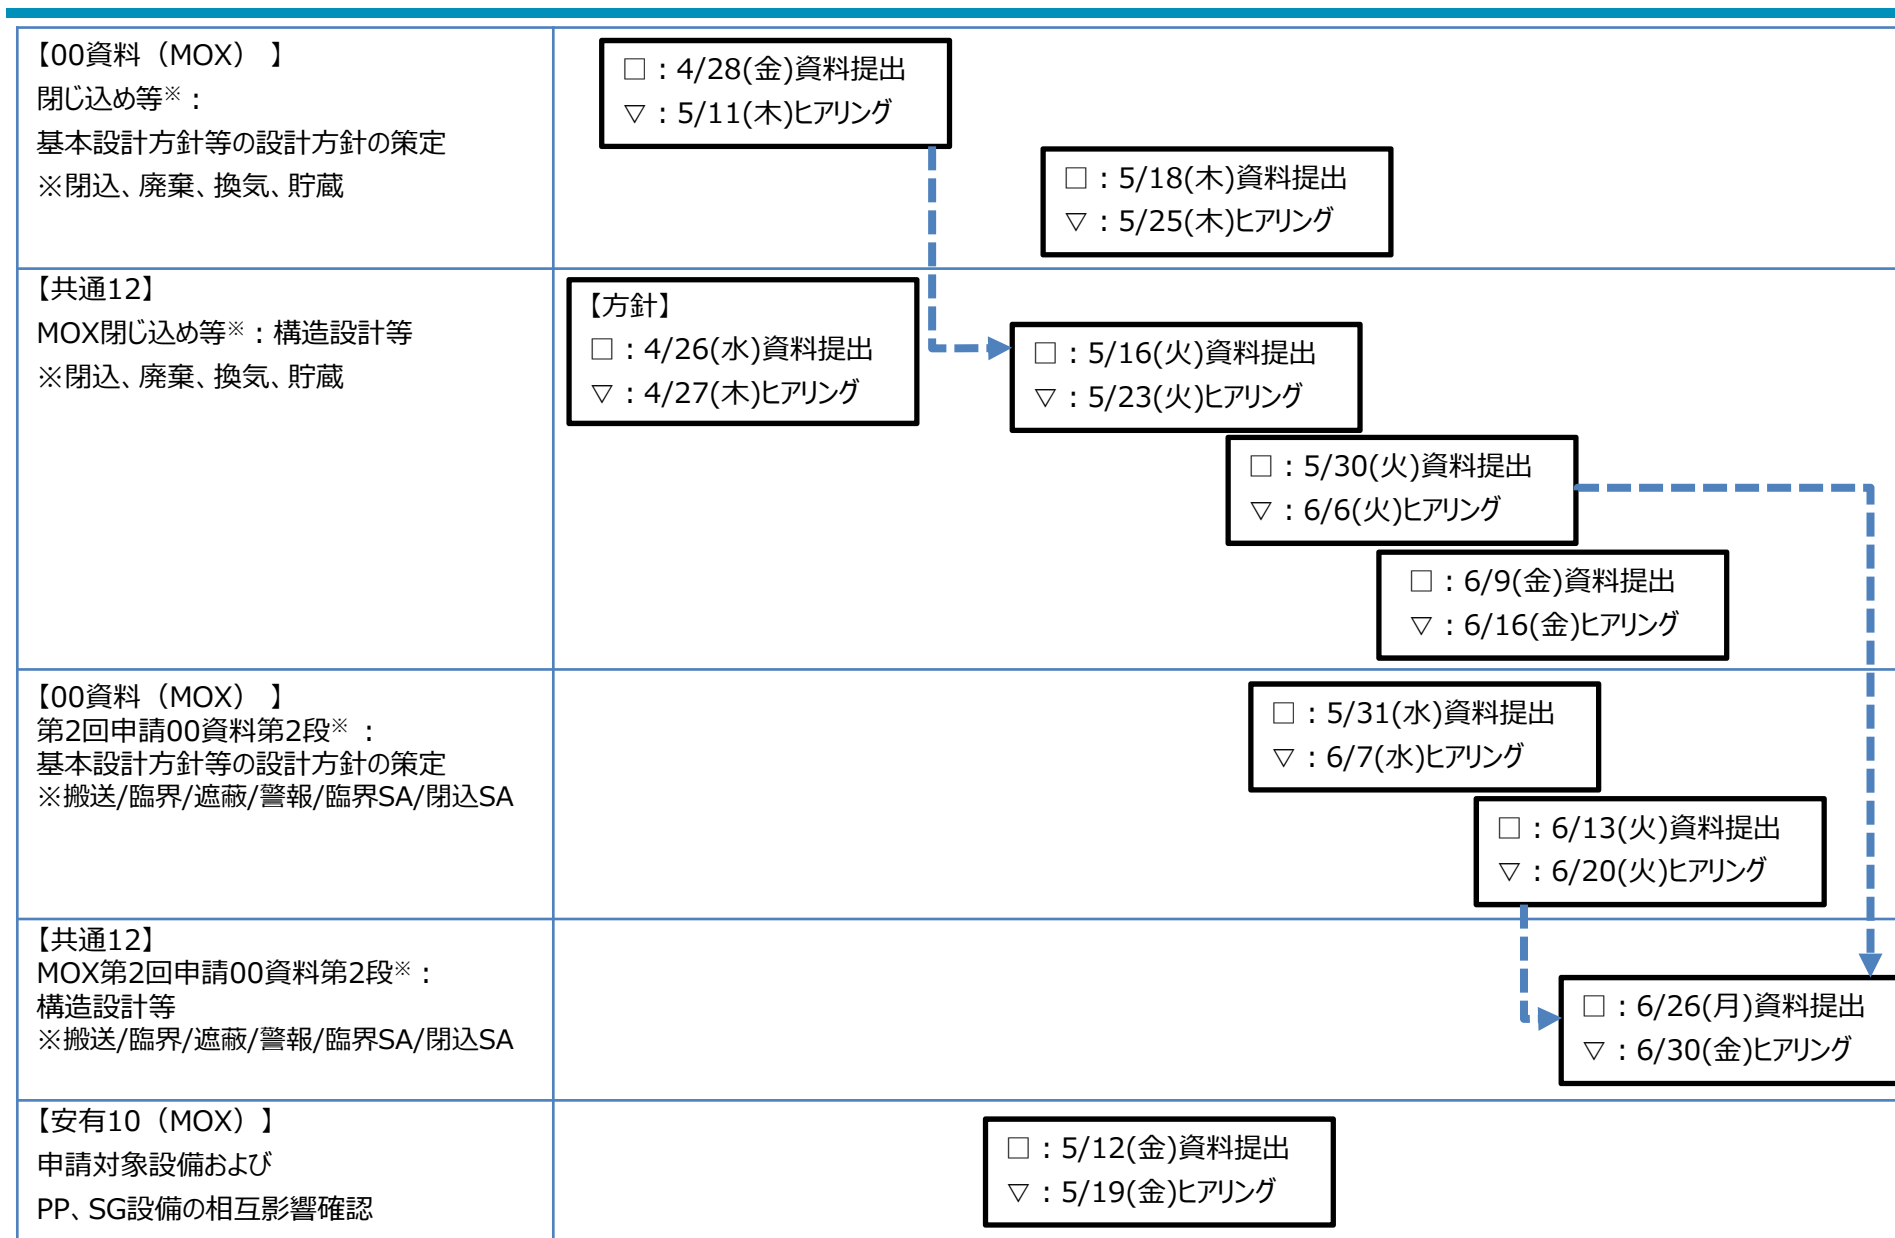

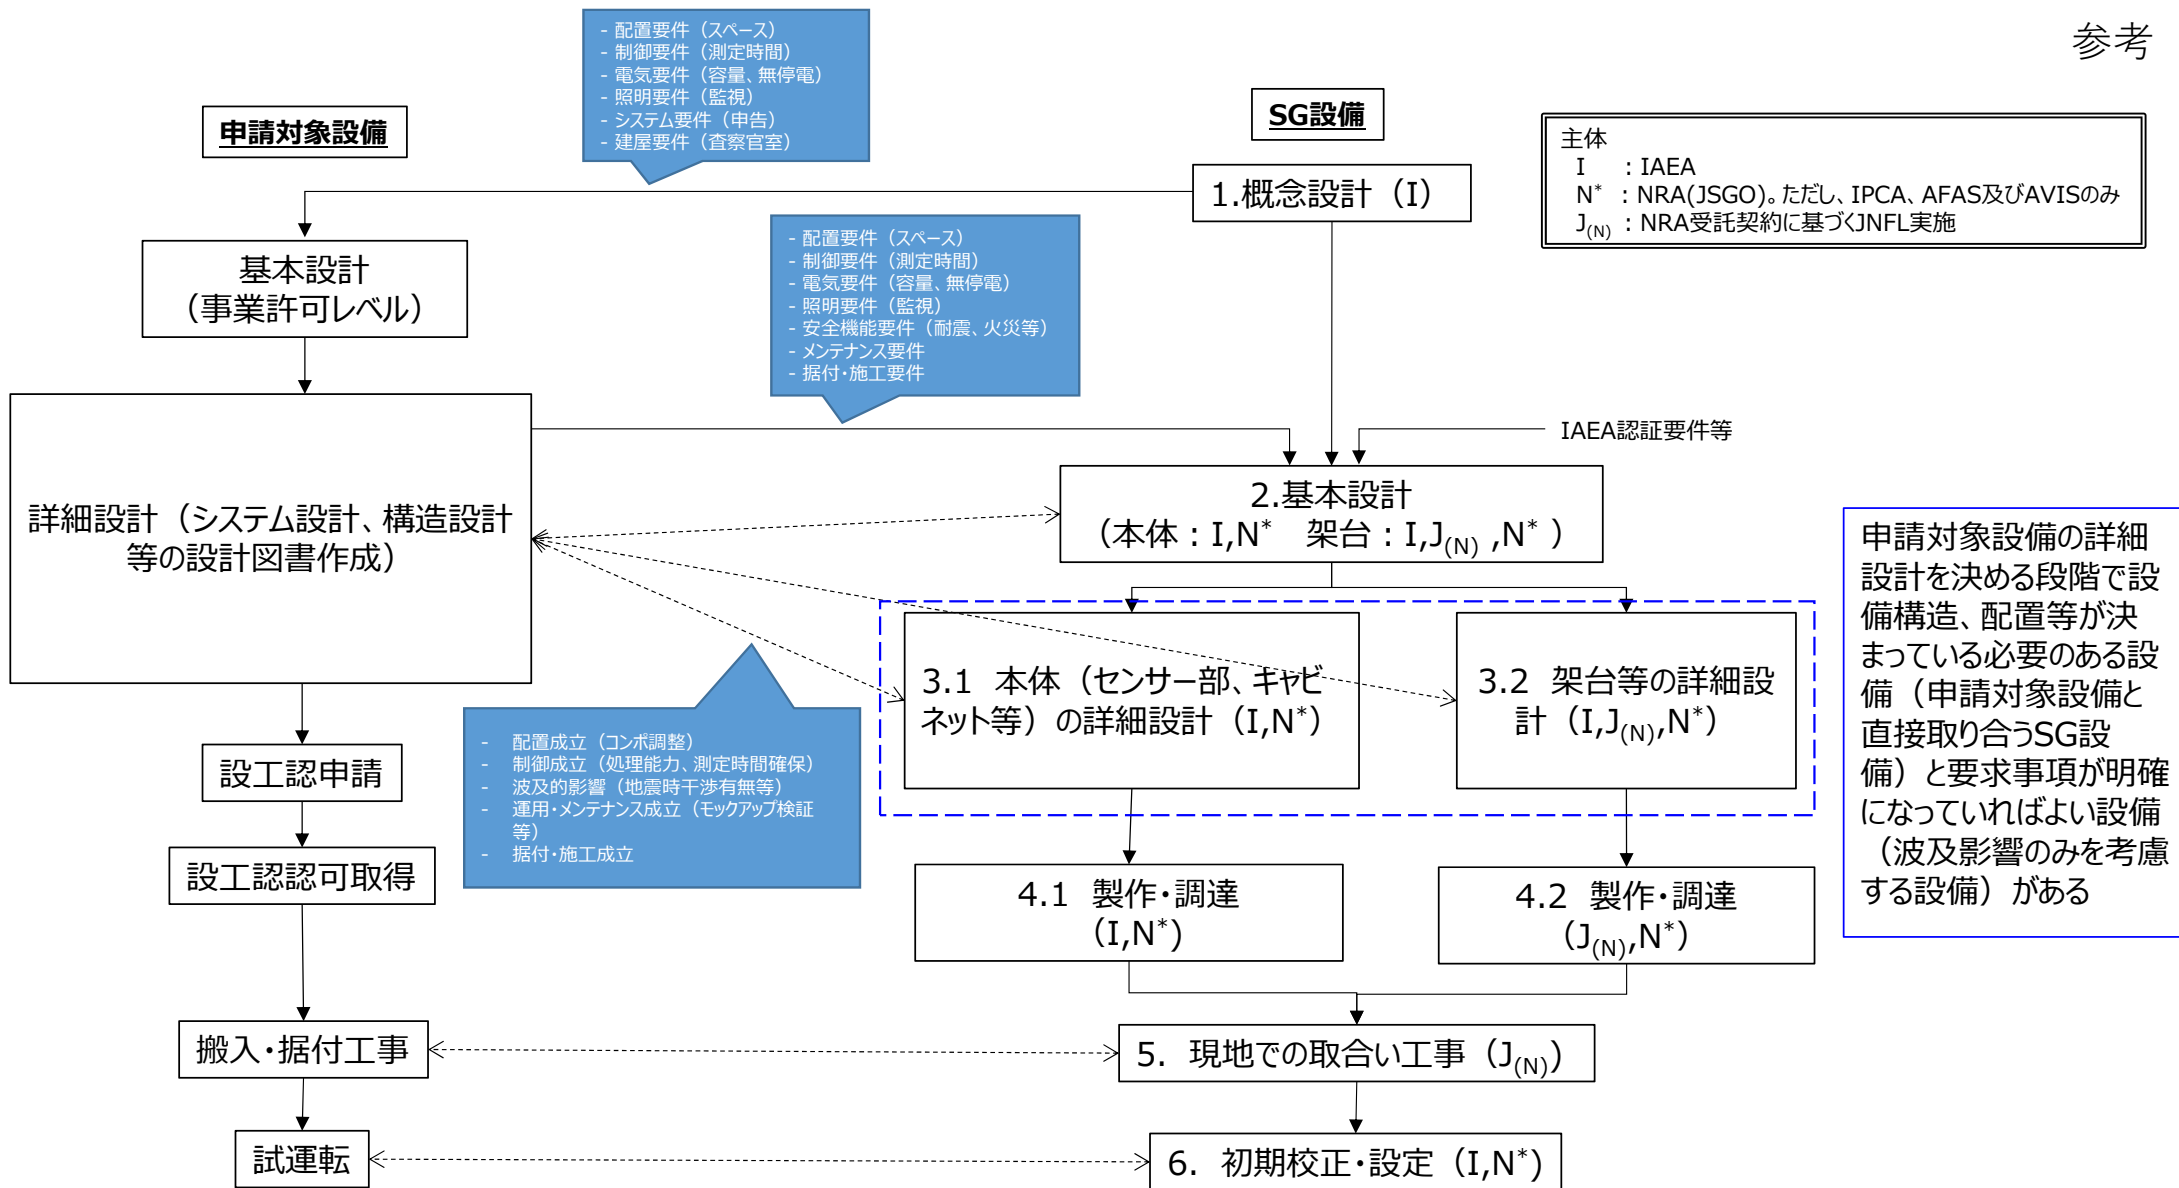

## 第2回申請対象設備と関連するSG機器の設計状況

施設	設備	機器	安全機能を有する施設等と一体となって設置されるSG設備	周辺に設置されるSG設備	設計状況（ステータス）		
					本体（センサー部・キャビネット等）	架台等	
被覆施設	燃料棒加工工程搬送設備	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-1	—	・搬送用機用NDA (AMGB-7) ペレット保管容器搬送装置GB-14の周辺に取り付くSG機器 ※AMGB (Advanced Material accountancy Glove Box system) : 搬送容器測定装置	<b>○本体</b> <b>詳細設計中 (I)</b> ・申請対象設備との配置成立，制御成立，運用メンテナンス成立については確認済み。 ・転倒，落下等により，申請対象設備に波及的影響を及ぼすおそれがないことを確認済み。 ・申請対象設備との据付・施工成立については確認済み。	<b>○架台</b> <b>詳細設計完了 (J<sub>(N)</sub>)</b> ・申請対象設備の制御成立については該当なし。 ・申請対象設備との配置成立，運用・メンテナンス成立については確認済み。 ・申請対象設備との据付・施工成立については確認済み。  <b>製作・調達中 (J<sub>(N)</sub>)</b>	
		ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-2	—	同上	同上	同上	
		ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-7	—	同上	同上	同上	同上
		ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-8	—	・査察現場キャビネット(LC-15B)	追而		
		乾燥ボート搬送装置グローブボックス-6	—	・搬送用容器用NDA (AMGB-6) ※AMGB (Advanced Material accountancy Glove Box system) : 搬送容器測定装置			

## 第2回申請対象設備と関連するSG機器の設計状況

施設	設備	機器	安全機能を有する施設等と一体となって設置されるSG設備	周辺に設置されているSG設備	設計状況（ステータス）	
					本体（センサー部・キャビネット等）	架台等
組立施設	燃料集合体組立設備	マガジン編成装置	FRCS（マガジン編成装置の機器である洗浄機架台から支持） ※FRCS（Fuel Rod Counting Station）：組立用燃料棒本数測定装置	—	<b>○本体</b> <b>詳細設計中（I）</b> ・申請対象設備との配置成立，制御成立，運用・メンテナンス成立については確認済み。 ・申請対象設備への耐震上の波及的影響がないことを確認済み ・申請対象設備との据付・施工成立については確認済み	<b>○マガジン編成装置</b> <b>詳細設計完了（J<sub>(N)</sub>）</b> ・申請対象設備の制御成立については該当なし。 ・申請対象設備との配置成立，運用・メンテナンス成立については確認済み。 ・申請対象設備との据付・施工成立については確認済み。  <b>製作・調達中（J<sub>(N)</sub>）</b>
	燃料集合体組立工程搬送設備	リフト	—	・燃料集合体用NDA（AFAS-P,AFAS-B） ・査察現場キャビネット（LC-21B,LC-21A） ※AFAS-P（Advanced Fuel assembly Assay System-PWR）：PWR燃料集合体測定装置 ※AFAS-B（Advanced Fuel assembly Assay System-BWR）：BWR燃料集合体測定装置	追而	
	梱包・出荷設備	貯蔵梱包クレーン	—	・燃料集合体用NDA（DIPD） ※DIPD（Directional Item Passage Detector）：燃料集合体通過検知器		
		容器蓋取付装置	—	・燃料集合体用NDA（DIPD） ※DIPD（Directional Item Passage Detector）：燃料集合体通過検知器		
