

実験利用棟 階段受梁について

令和元年12月6日
日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所

1. 経緯

実験利用棟耐震改修工事（壁増打）において、増打を実施するため、当該部の階段及び天井等を撤去したところ、階段踊場部分に階段受梁があることが判明した。

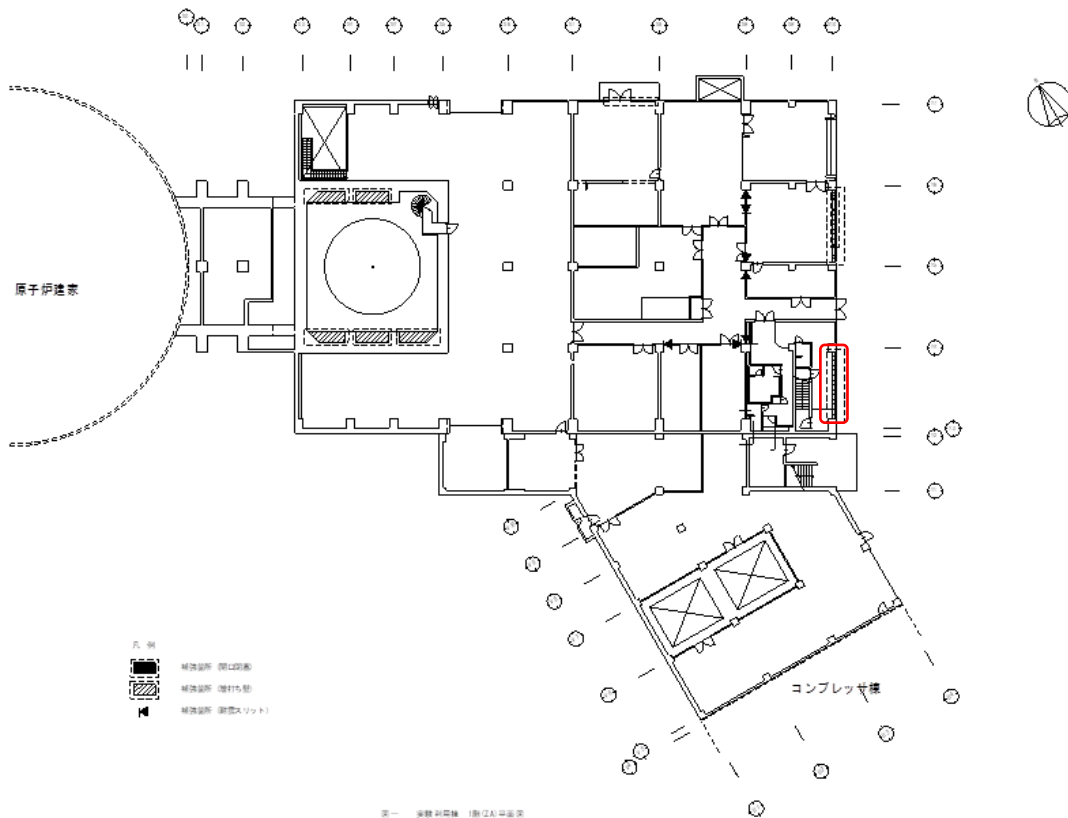


図-1.2 実験利用棟 1階 (ZA) 平面図

2. 設工認への影響について

当該部は耐震壁の増打補強で有り、受梁があるものの、補強に影響は無く、添付計算書への影響もない。

ただし、図-2.1.34において一部図面が変更となるが、注書きを適用し、現場合わせにて対応することとしたい。
