許認可審査対応スケジュール

令和2年3月19日

:申請から許認可期間
:工事又は製作期間
:使用前検査期間

●審査終了案件

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数(2019～2020) 10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	許認可期限の理由
1	HTTR	設置許可		④	2014/11/26	2020/4/15				4	4	1							・国際協力(OECD/NEA LOFCプロジェクト)に基づく冷却材喪失試験を実施する必要があり、その実施期限(報告書とりまとめを含む)に間に合うように運転による試験データを取得する必要があるため。※契約期間延長は、すでに4回行ってきている。 ・ガス炉開発に関し、ポーランドとの国際協力を円滑に実施するため、早急な運転再開が必要である。
2	JRR-3	設工認(その10)	ステンレス製密封容器の密封性、ケーブルの分離設備の設置、保管廃棄施設の設置	④	2019/4/2	2020/4/30			2	1	1	3							運転再開に向けた作業工程上、ケーブルの分離設備設置工事をR2年度前半に完了する必要がある。 →R1年度内に実施する予定でいたが、工程を変更しR2年度前半に実施することとした。
3	STACY	設工認(その3)	炉心、原子炉容器(格子板)の新設、安全保護回路の改造等	④	2019/3/29	2020/4/30	3	3	1										NRA受託事業(1Fデブリ臨界評価手法の整備　、令和3年度完了)を実施するため、令和3年9月の運転再開に向けて、令和2年度始めに工事着手しなければならない。本設工認については、継続案件であり、コメントの最終確認を受けて審査が終了する予定であることから、引き続き審査を進めていただきたい。
4	STACY	設工認(その2)	STACY更新	④	2017/8/10	2020/3/27													NRA受託事業(1Fデブリ臨界評価手法の整備　、令和3年度完了)を実施するため、令和3年9月の運転再開に向けて、令和2年度始めに工事着手しなければならない。
5	大洗廃棄物管理施設	設工認	β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備指示調節計の更新	④	2018/12/26	2020/3/23													施設の維持管理に必要な設備であり、高経年化対応で早期に更新する必要があるため。
6	JRR-3	設工認(その12)	冠水維持機能喪失時用給水設備の設置	④	2019/11/20	2020/3/31			1	1	2								運転再開に向けた作業工程上、冠水維持機能喪失時用給水設備設置工事をR2年度前半に完了する必要がある。 →R1年度内に実施する予定でいたが、工程を変更しR2年度前半に実施することとした。
7	JRR-3	設工認(その1)	廃液貯槽の漏えい検知器設置、通信連絡設備の設置、モニタリングポスト等の情報伝達設備の付加	④	2018/9/3	2020/3/31													運転再開に向けた作業工程上、廃液貯槽の漏えい検知器設置工事をR2年度前半に完了する必要がある。 →R1年度内に実施する予定でいたが、工程を変更しR2年度前半に実施することとした。
8	大洗廃棄物管理施設	設工認	構内一斉放送装置の更新	④	2018/12/26	2020/3/23			1										令和2年3月より工事予定であり、予算執行の都合上早急に認可が必要があるため。
–	STACY	設工認(TRACYとの系統隔離)	TRACYの廃止措置に伴う配管切断閉止による系統隔離	④	2019/6/21	2020/3/31													TRACY廃止を進めるため、令和2年度上期に工事を完了する必要があるため。

●審査案件

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数(2019～2020) 10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	許認可期限の理由
1	むつ	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更(※) ※廃棄物パッケージ取扱場所、廃棄物保管場所の追加を含む	⓪	2020/4/1	2020/6/30						1							
2	原科研(炉)	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							
3	原科研(埋設)	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							新検査制度に対応するため。 むつについては、令和2年度より分別作業を開始するため、新検査制度対応と併せた内容で申請する。
4	大洗研(炉北地区)	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							審査効率化のため、合同審査を希望する。
5	大洗研(炉南地区)	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							
6	大洗廃棄物管理施設	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							
7	むつ	廃止措置計画	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						1							
8	JRR-2	廃止措置計画	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							
9	JRR-4	廃止措置計画	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							新検査制度に対応するため。 審査効率化のため、合同審査を希望する。
10	TRACY	廃止措置計画	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							
11	DCA	廃止措置計画	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更	⓪	2020/4/1	2020/6/30						(1)							
12	HTTR	—	設工認要否整理表	①				1			1	1							
13	処理場	—	設工認要否整理表	①				4	3	3	2								
14	大洗廃棄物管理施設	—	設工認要否整理表(※) ※OWTF係るものを除き終了	②			4	2	2										

＜記号＞
▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績

＜審査状況＞
⓪:未申請　①:審査前半((ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施)　②:審査後半(審査会合で審査中)　③:審査会合終了後、補正申請準備中　④:規制庁事務手続き中(事務手続き中の補正申請含む)

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は2回/月を想定。

許認可審査対応スケジュール

令和2年3月19日

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数(2019～2020) 10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	許認可期限の理由
15	JRR-3	設工認(その１１)	原子炉プール及び原子炉本体の構造(耐震性)	①	2019/8/8	2020/4/30			2	2	2	1							制御棒案内管の製作を予定しており、その１１の認可後、早急に制御棒案内管の製作の補正を行う必要があるため。 →審査の進捗を踏まえ、許認可期限を見直したが、これ以上遅延すると制御棒案内管の製作が運転再開に間に合わなくなる。
16	HTTR	設工認(その3)	構内一斉放送等通信連絡設備の設置	①	2018/11/16	2020/6/24		1	2			1	1						大洗廃棄物管理事業側で構内一斉放送設備の設工認取得後工事を開始することとなったため、HTTRとしては構内一斉放送設備については既設設備として申請し、認可を取得する方針に変更したため、許認可期限を延期した。 一方で、運転再開希望時期に鑑み、許認可期限を2020/6/24とした。
17	HTTR	設工認(その2)	防火帯の設置、火報の追設、ケーブルトレイのラッピング処理等	①	2018/7/11	2020/6/3					1	3	1						令和2年7月より工事予定であり、予算執行の都合上早急に認可が必要があるため。 (定期事業者検査を実施する部屋と重複するため、工事期間がある程度必要。なお、当初6カ月としていたが、許可取得時期の遅延と運転再開時期との関係に鑑み、工事を複数個所同時に実施する工程に見直し、工事期間を4カ月とした)。
18	JRR-3	制御棒案内管の製作	制御棒案内管４体の製作	①	2011/8/19	2020/4/31			1	1	1	1							制御棒案内管の製作には約8ヶ月を要することから、2021年2月に運転再開するためには2020年4月から製作開始する必要があるため。 →審査の進捗を踏まえ、許認可期限を見直したが、これ以上遅延すると制御棒案内管の製作が運転再開に間に合わなくなる。
19	JRR-3	保安規定		①	2014/9/26	2020/8/31						1	2	2	2				運転再開までに認可が必要であり、下部規定等の整備も必要なため許認可期限をR1年度内に設定していたが、後段規制との関係の整理を踏まえ、保安規定の申請内容を確認する必要があるため、許認可期限をR2年度に変更する。
20	大洗廃棄物管理施設	設工認	遮蔽スラブの追加	②	2017/9/25	2020/5/29				1	1								次年度工事を開始して固体集積保管場Ⅳに保管しているコンクリートブロック型廃棄物を可能な限り早期に固体集積保管場Ｉへ移送し、固体集積保管場Ⅳのドラム缶型廃棄物の保管スペースを確保する必要があるため。 (対象設備の確認及び審査会合でのコメントへの回答に係る審査会合を1回実施。これに向けた面談をルール上の上限の2回実施。)
21	STACY	設工認(その4)	棒状燃料貯蔵設備他の改造等	②	2019/12/24	2020/4/30			3	2									運転再開に向けて、更新炉の機能試験前に完了する必要があることから、令和2年3月までに工事着手する必要があるため。
22	処理場	保安規定(保管体健全性確認)	保管廃棄施設・Lの健全性確認	③	2018/6/1	2020/4/17			2	2									第3回原子力機構バックエンド対策監視チーム(令和元年9月26日)における議論を踏まえ、保管廃棄施設・Lの保管体健全性確認の本格運用の早期開始のため。
23	原科研	保安規定	原電緊対所等設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更	①	2020/3/2	2020/5/15					1								日本原子力発電(株)の緊急時対策所設置工事を行う上で、機構の周辺監視区域を変更する必要がある。認可が遅れると作業エリアと干渉し、原電の工事計画に影響を及ぼすため。
24	原科研 STACY TCA	設置変更許可	原科研敷地境界変更 STACY(TCAの廃止措置に伴う燃料受入れ) TCA(使用済燃料の処分方法の変更)	②	2019/12/25	2020/5/29			3	1	1								東海第二発電所は、平成30年9月26日付けをもって原科研の敷地の一部を同発電所の敷地として利用することを前提として新規制基準適合性確認に係る設置変更許可を受けた。原子力機構は、平成30年12月3日付けで原電に対し、当該敷地を原電の建物建設を目的として賃貸している。このため、当該敷地を原科研の敷地から除く設置変更許可を速やかに取得しなければ、東海第二発電所の再稼働に係る工程に影響を与えるため。
25	大洗廃棄物管理施設	設工認	火災報知機の追加	②	2018/12/26	2020/5/15	(2)	(2)											新規制基準への適合上、施設の維持管理に必要な設備として追加工事を年度内に完了させる必要があるため。 【10/30審査会合で概ね終了。審査会合における質問の回答を11/12及び11/26に行った。審査会合でのコメント回答に係る面談ををルール上の上限の2回実施。その後審査会合を実施予定。】
26	大洗廃棄物管理施設	設工認	OWTFの新規制基準対応及び予備品リストの追加	②	2018/2/28	2020/5/15		(1)											令和4年度運転開始に向けた使用前検査受検(令和2年2月開始予定)のする必要があるため。 【使用前検査の立会を1回/2週間と想定し、必要な立会回数に基づき運転開始時期から逆算。対象設備の確認・回答に係る審査会合を1回、これに向けた面談を2回実施と想定。】
27	HTTR	設工認(その1)	監視設備、安全避難通路等	①	2018/2/9	2020/6/3						2	1						令和2年7月より工事予定であり、予算執行の都合上早急に認可が必要があるため。
28	HTTR	設工認(その4) (その5及びその6と合本予定)	建家・機器等の耐震評価(評価のみ) 保管廃棄施設、溢水対策機器(評価のみ) 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止対策機器 (資機材準備あり)	①	2019/5/21	2020/6/24						4	2						資機材の準備後、運転再開前迄に訓練等を実施し習熟するための期間に鑑み、許認可期限を設定。
29	HTTR	保安規定		①	2014/11/26	2020/6/24													運転再開時期及び定期事業者検査期間より逆算に認可を受ける必要があるため。
30	処理場	設工認(その6)	液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置	②	2018/11/29	2020/6/30					1	2							JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う排水貯留ポンドを使用できなくなり、JRR-3等の運転ができない状態となることから、先行使用が認められた場合でも、令和3年1月までに本設工認に係る適合性確認を終了するため。
31	STACY	設工認(TCA燃料貯蔵)	TCA燃料受入れに伴う貯蔵設備の新設	⓪	2020/5/1	2020/10/30							2	2	2	2			TCAの廃止措置を進めるために、TCA燃料をSTACYに移管しなければならないため。また、STACY更新炉の新規制基準対応後に運用を開始するため、令和3年度10月までに検査を行う。
~~－~~	~~むつ~~	~~保安規定~~	~~廃棄物パッケージ取扱場所、廃棄物保管場所の追加~~	~~⓪~~	~~2020/4/1~~	~~2020/7/1~~													~~機構大で検討している新検査制度対応のための保安規定改正と合わせて申請する予定であったが、本件改正作業は機構大の改正とは別に申請することとなったため。~~ ~~(令和2年度より分別作業を開始するための改正であり、優先順位の高い案件の審査が済んだ後、新検査制度対応と併せた内容で申請することを希望)。~~
32	TCA	廃止措置計画		②	2019/4/26	2021/3/31			2	1	2	2	1	1					TCAの廃止措置を進めるため、速やかに原子炉機能停止措置及びSTACYへの燃料移管を完了する必要があるため。 新検査制度に伴う変更については、補正で対応する。
33	TCA	保安規定	廃止措置に伴う変更	①	2019/11/15	2021/3/31													TCAの廃止措置を進めるため、速やかに原子炉機能停止措置及びSTACYへの燃料移管を完了する必要があるため。 新検査制度に伴う変更については、補正で対応する。
34	JRR-3	設工認(その１３)	核燃料物質貯蔵設備、１次冷却系設備等の構造(耐震性)、内部溢水等の適合性、中央制御室外原子炉停止盤、外部事象影響	⓪	2020/3/31	2020/9/30					1	2	2	2	2				工事を伴うものでないが、2021年2月の運転再開までに認可及び使用前検査の完了が必要なため。 →設工認要否整理の結果、その13として申請するものが増えたため、申請時期をR2年3月末に変更する。
35	処理場	設工認(その１０)	津波防護対策	②	2019/7/4	2020/9/30						2	2	2	2	1	1		新規制基準対応をできるだけ早く行う観点から、令和4年3月までに処理場全体の適合性確認を終了するため。なお、JRR-3の運転再開時期(令和3年2月)等より、処理場全体の適合性確認の終了が遅れることになるため、JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う保管廃棄施設・L、排水貯留ポンドについて、「事業許可又は設置許可を受けた核燃料施設等について先行して一部の施設を使用する場合の手続き」(2018年12月19日原子力規制委員会)に基づく先行使用の手続き(令和2年4月からは、実用炉における「一部使用承認」と同等の手続きに移行予定)を行うことにより、各原子炉の運転を認めて頂きたいと考えている。
36	処理場	設工認(その１１)	第３廃棄物処理棟、減容処理棟及び解体分別保管棟の耐震補強	①	2019/7/4	2020/9/30						2	2	2	2	1	1		

＜記号＞
▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績

＜審査状況＞
⓪:未申請　①:審査前半((ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施)　②:審査後半(審査会合で審査中)　③:審査会合終了後、補正申請準備中　④:規制庁事務手続き中(事務手続き中の補正申請含む)

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は2回/月を想定。

許認可審査対応スケジュール

令和2年3月19日

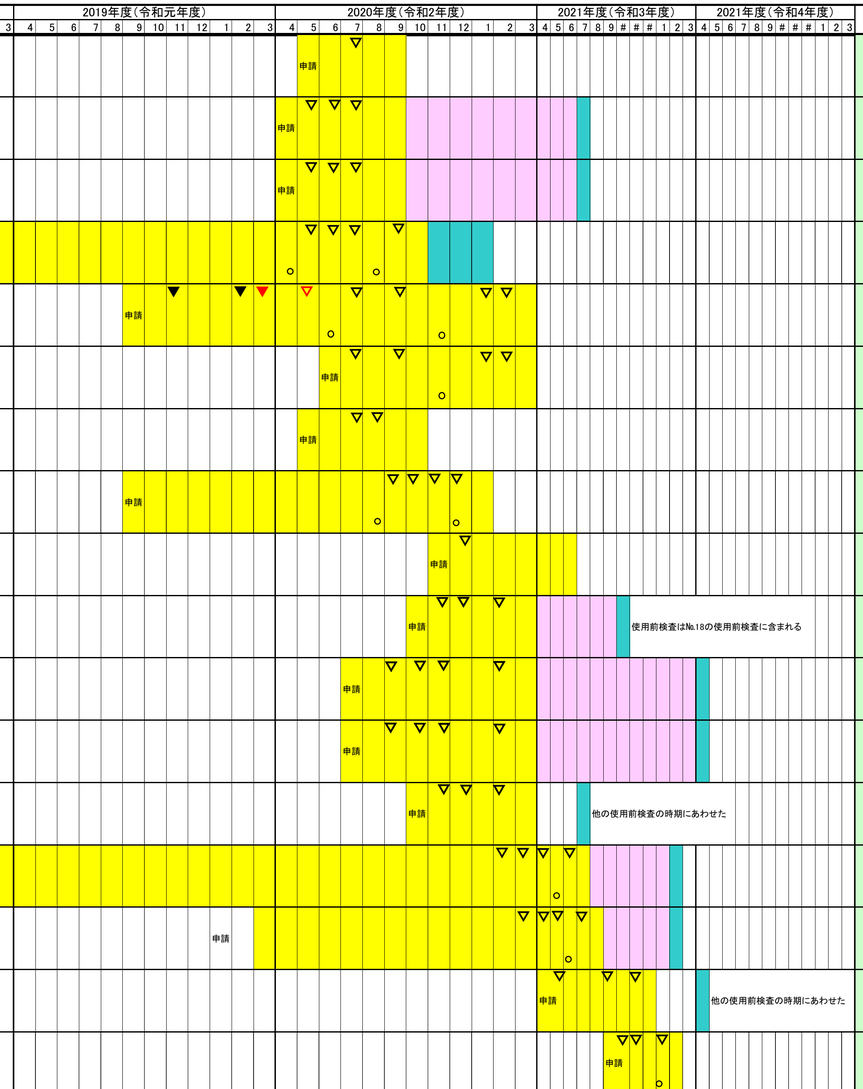

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数（2019～2020） 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9	許認可期限の理由
37	原科研	保安規定	原電防潮堤設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更	⓪	2020/5/15	2020/9/30	1 1	日本原子力発電（株）の適合確認に伴う、防潮堤設置工事を行う上で、機構の周辺監視区域を変更する必要がある。認可が遅れると作業エリアと干渉し、原電の工事計画に影響を及ぼすため。
38	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する設備の変更（その１）	⓪	2020/4/10	2020/9/30	1 2 2	事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
39	大洗廃棄物管理施設	設工認	仮設緩衝体の整備	⓪	2020/4/10	2020/9/30	1 2 2	事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
40	処理場	設工認（その３） ただし、第２編(第２廃棄物処理棟の火災対策)→設工認(その４)に統合	既設設備の設工認	①	2018/6/1	2020/10/29	2 2 2 2 1	JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う保管廃棄施設・L、排水貯留ポンドを使用できなくなり、JRR-3等の運転ができない状態となることから、先行使用が認められた場合でも、令和3年1月までに処理場共通事項に係る適合性確認を終了するため。
41	JMTR	廃止措置計画	JMTR施設の廃止措置計画認可申請書	②	2019/9/18	2021/3/31	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1	使用済燃料の対米輸送については、廃止措置の認可にかからわず、現行の許可の範囲で輸送可能であるが、事故・故障等の報告リスクを下げる必要があるため。新検査制度に伴う変更については、補正で対応する。 （点検・検査等の費用の面でも有利となるため速やかに認可を踏まえて、審査会合頻度を少なくし、面談頻度を1回/月に変更、また、保安規定申請時期を変更。認可時期を令和2年9月30日から令和3年3月31日に変更）
42	JMTR	保安規定	JMTR施設の廃止措置にかかる保安規定変更	⓪	2020/6/30	2021/3/31		廃止措置の認可と同時としたいため。
43	STACY	保安規定	運転に係る条項の復帰、棒状燃料貯蔵対応	⓪	2020/5/7	2020/10/30	2 2	運転再開に向けて、令和2年10月までに完了しなければならないため。
44	処理場	保安規定(第１回)	新規制基準対応(放射性廃棄物処理場全体)	①	2019/9/26	2021/1/29	1 3	JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う保管廃棄施設・L、排水貯留ポンドを使用できなくなり、JRR-3等の運転ができない状態となることから、先行使用が認められた場合でも、令和3年1月までに処理場共通事項の保安規定認可を取得する必要があるため。
45	STACY	保安規定（TCA燃料貯蔵）	TCA燃料貯蔵対応	⓪	2020/11/2	2021/6/30		TCA廃止を進めるために、TCA燃料をSTACYに移管しなければならないため。令和3年度10月以降にTCA燃料をSTACYに移管するため、それ以前に保安規定の認可が必要である。
46	大洗廃棄物管理施設	設工認	OWTFの施設外の通信連絡設備の設置	⓪	2020/10/9	2021/3/31		令和4年度運転開始のため。 （（ヒアリングR2.11：1回、R2.12：2回、R3.1：2回　計5回）（中長期計画による）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
47	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する設備の変更（その２）	⓪	2020/7/10	2021/3/31	1	適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（ヒアリングR2.10：2回、R2.11：2回、R3.1：2回　計7回）最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。申請内容からコメントが多数となる可能性と更問いを考慮しコメント回答の審査会合を3回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計6回）。）
48	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する建家の改修	⓪	2020/7/10	2021/3/31	1	事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（ヒアリングR2.10：2回、R2.11：2回、R3.1：2回　計7回）（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。申請内容からコメントが多数となる可能性と更問いを考慮しコメント回答の審査会合を3回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計6回）。）
49	大洗廃棄物管理施設	設工認	新たに規制対象となった設備の追加（その１）	⓪	2020/10/9	2021/3/31		事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（ヒアリングR2.11：1回、R2.12：2回、R3.1：2回　計5回）（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
50	処理場	設工認（その４） ただし、第３編(第３廃棄物処理棟の堰)→設工認(その３)に統合	第２廃棄物処理棟のセル排風機自動消火設備及び配電盤溢水防護カバーの設置	①	2018/8/29	2021/7/30		新規制基準対応をできるだけ早く行う観点から、令和4年3月までに処理場全体の適合性確認を終了するため。
51	処理場	設工認（その１２）	固体廃棄物一時保管棟の設置	⓪	2020/12/1	2021/8/31		新規制基準対応をできるだけ早く行う観点から、令和4年3月までに処理場全体の適合性確認を終了するため。
52	大洗廃棄物管理施設	設工認	新たに規制対象となった設備の追加（その2）	⓪	2021/4/9	2021/12/27		事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（ヒアリングR3.5：1回、R3.8：2回、R3.10：2回　計5回）（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
53	処理場	保安規定(第２回)	新規制基準対応(津波防護施設等)	⓪	2021/8/31	2022/2/28		新規制基準対応をできるだけ早く行う観点から、令和4年3月までに処理場全体の適合性確認を終了するため。
54	大洗廃棄物管理施設	保安規定		①	2014/3/14	未定		
55	FCA	廃止措置計画		⓪	2020/6/30	－		－
56	FCA	設置変更許可	FCA使用済燃料の処分に係る変更	⓪	2020/6/30	－		－
57	FCA	保安規定	廃止措置に伴う変更	⓪	2020/8/31	－		－

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
全体ヒアリング回数（合計）	13	17	14	25	20	16	31	22	21	21	6	7
廃棄物管理事業及び廃止措置等ヒアリング回数（合計）	6	2	4	4	3	3	5	3	6	8	1	1
試験研究炉ヒアリング回数（合計）	7	15	10	21	17	13	26	19	15	13	5	6

＜記号＞
▽：審査会合、○：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

＜審査状況＞
⓪：未申請　①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）　②：審査後半（審査会合で審査中）　③:審査会合終了後、補正申請準備中　④：規制庁事務手続き中（事務手続き中の補正申請含む）

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は2回/月を想定。
