

# 志賀原子力発電所2号炉


## 地質・地震・津波・火山関係に係る 今後の審査スケジュールについて

2023年5月12日  
北陸電力株式会社

---

余白

- 
- 第1121回 審査会合(2023年3月3日)において、敷地内断層の審査に続く「今後の審査全体のスケジュールについて説明すること」とのコメントを受けた。




- 現在審査中の敷地近傍および敷地周辺断層の審査に基準地震動、基準津波および火山等の審査項目も加えた審査全体のスケジュールについて、審査時期・順序等の審査の進め方の要望をご説明する。

# 1. 審査スケジュール案(地質・地震・津波・火山関係)

○今後の審査スケジュール案を以下に示す。

○今後の審査の進め方の要望(下表①～⑩)については、次ページに示す。

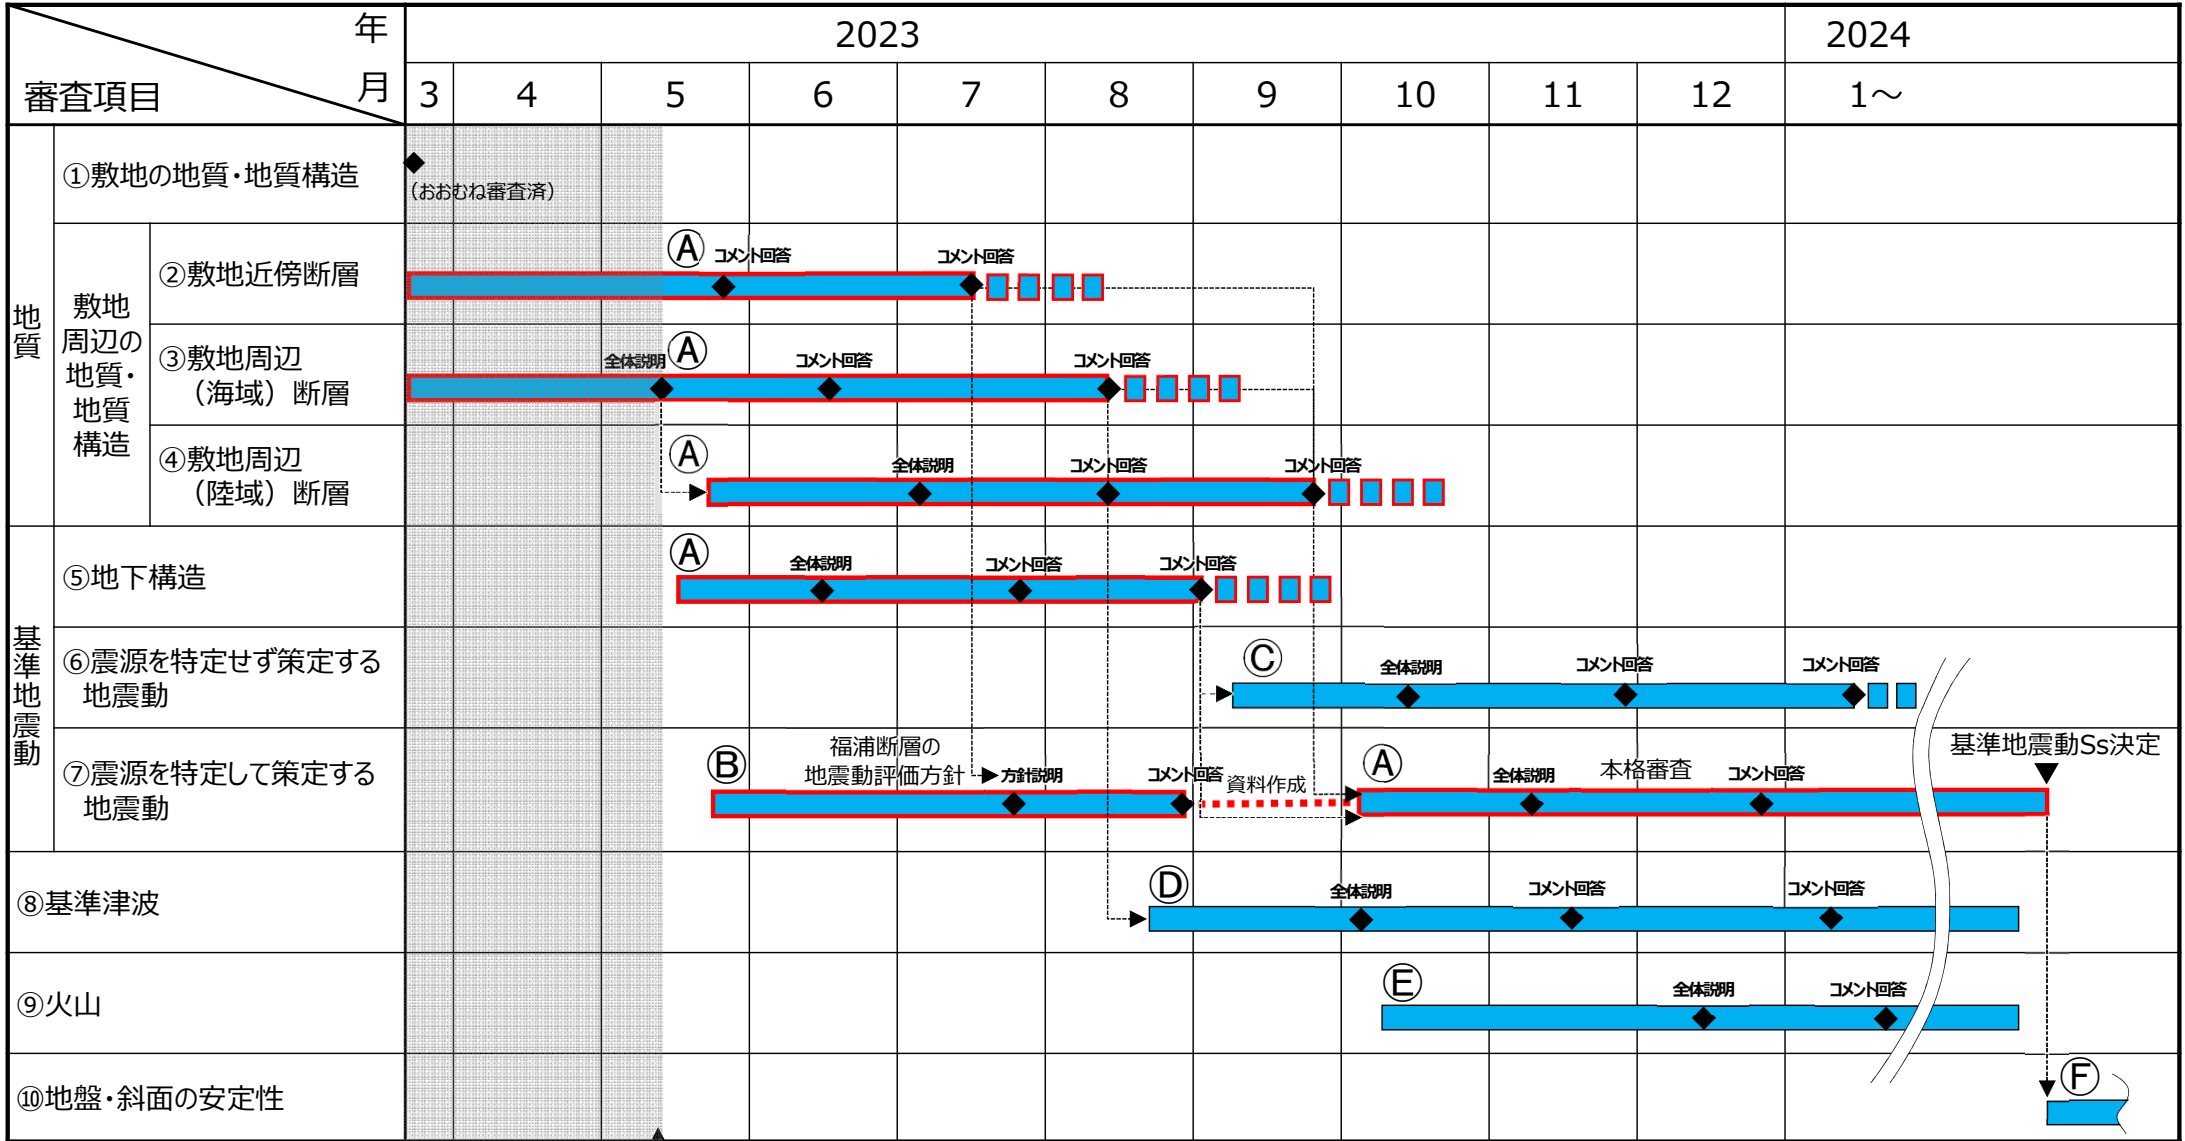

現時点 ◆ : 審査会合

■ : 資料提出から審査終了までの想定期間(表示したコメント回答の審査会合は想定であり時期や回数は変化する可能性がある)

( ■ ) 基準地震動Ss決定までの審査で現時点でクリティカル工程と想定している項目

## 2. 審査の進め方の要望

### クリティカル工程について

①：今後の地質・地震・津波・火山関係の審査において、審査工程上のクリティカルは、

- ・「②敷地近傍断層」
  - ・「③④敷地周辺断層」
  - ・「⑤地下構造」
- } → 「⑦震源を特定して策定する地震動」

と想定しており、今後は、②③④⑤⑦を最優先項目として審査をお願いしたい。

②：「⑦震源を特定して策定する地震動」の審査では、福浦断層の地震動評価がポイントと想定しており、⑦の本格審査が開始される前に、福浦断層の地震動評価方針について審査をお願いしたい（⑦の本格審査の前に、評価方針に基づく資料作成期間を確保したい）。

### その他

クリティカルと想定していない⑥⑧⑨⑩の項目についても、以下のとおり要望致します。

③：「⑥震源を特定せず策定する地震動」と「⑦震源を特定して策定する地震動」の審査について、⑦の本格審査資料を準備するため、⑥を先行して審査を開始して頂きたい。

④：「⑧基準津波」の審査について、③の審査が終了した後に、開始して頂きたい。

⑤：「⑨火山」の審査について、⑨は他の審査項目の進行に影響を受けない独立した項目であり、⑦の本格審査の開始以降に審査をお願いしたい。

⑥：「⑩地盤・斜面の安定性」の審査について、基準地震動Ssの決定以降に審査をお願いしたい。
